

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PAKET PENGADAAN PCI GIRDER
PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN DAN JALAN ELEVATED KAWASAN
KARAWANG

Periode 16 Februari 2024 s.d. 17 Juni 2024



Terhitung selama 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) hari kalender

PT WIJAYA KARYA BETON TBK.

SURAT PERJANJIAN

Nomor :



Tanggal : 16 Februari 2024

Daftar Isi


Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	1
A. Jadwal Pekerjaan	2
B. Pelaksanaan Pengadaan PCI Girder	3
C. Foto-foto keseluruhan Kegiatan	6
Lembar Pengesahan	7

	LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAKET PENGADAAN PCI GIRDER PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN ELEVATED KAWASAN KARAWANG	
--	--	--

Topik	A. Jadwal Pekerjaan B. Pelaksanaan Pengadaan PCI Girder C. Foto-foto keseluruhan Kegiatan
Nama Paket	Paket Pengadaan PCI Girder


A. Jadwal Pekerjaan

Nama Paket	:	Paket Pengadaan PCI Girder
Nama Proyek	:	Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dan Jalan Elevated Kawasan Karawang
Lokasi	:	Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang
Waktu	:	123 (Seratus Dua Puluh Tiga) hari kalender

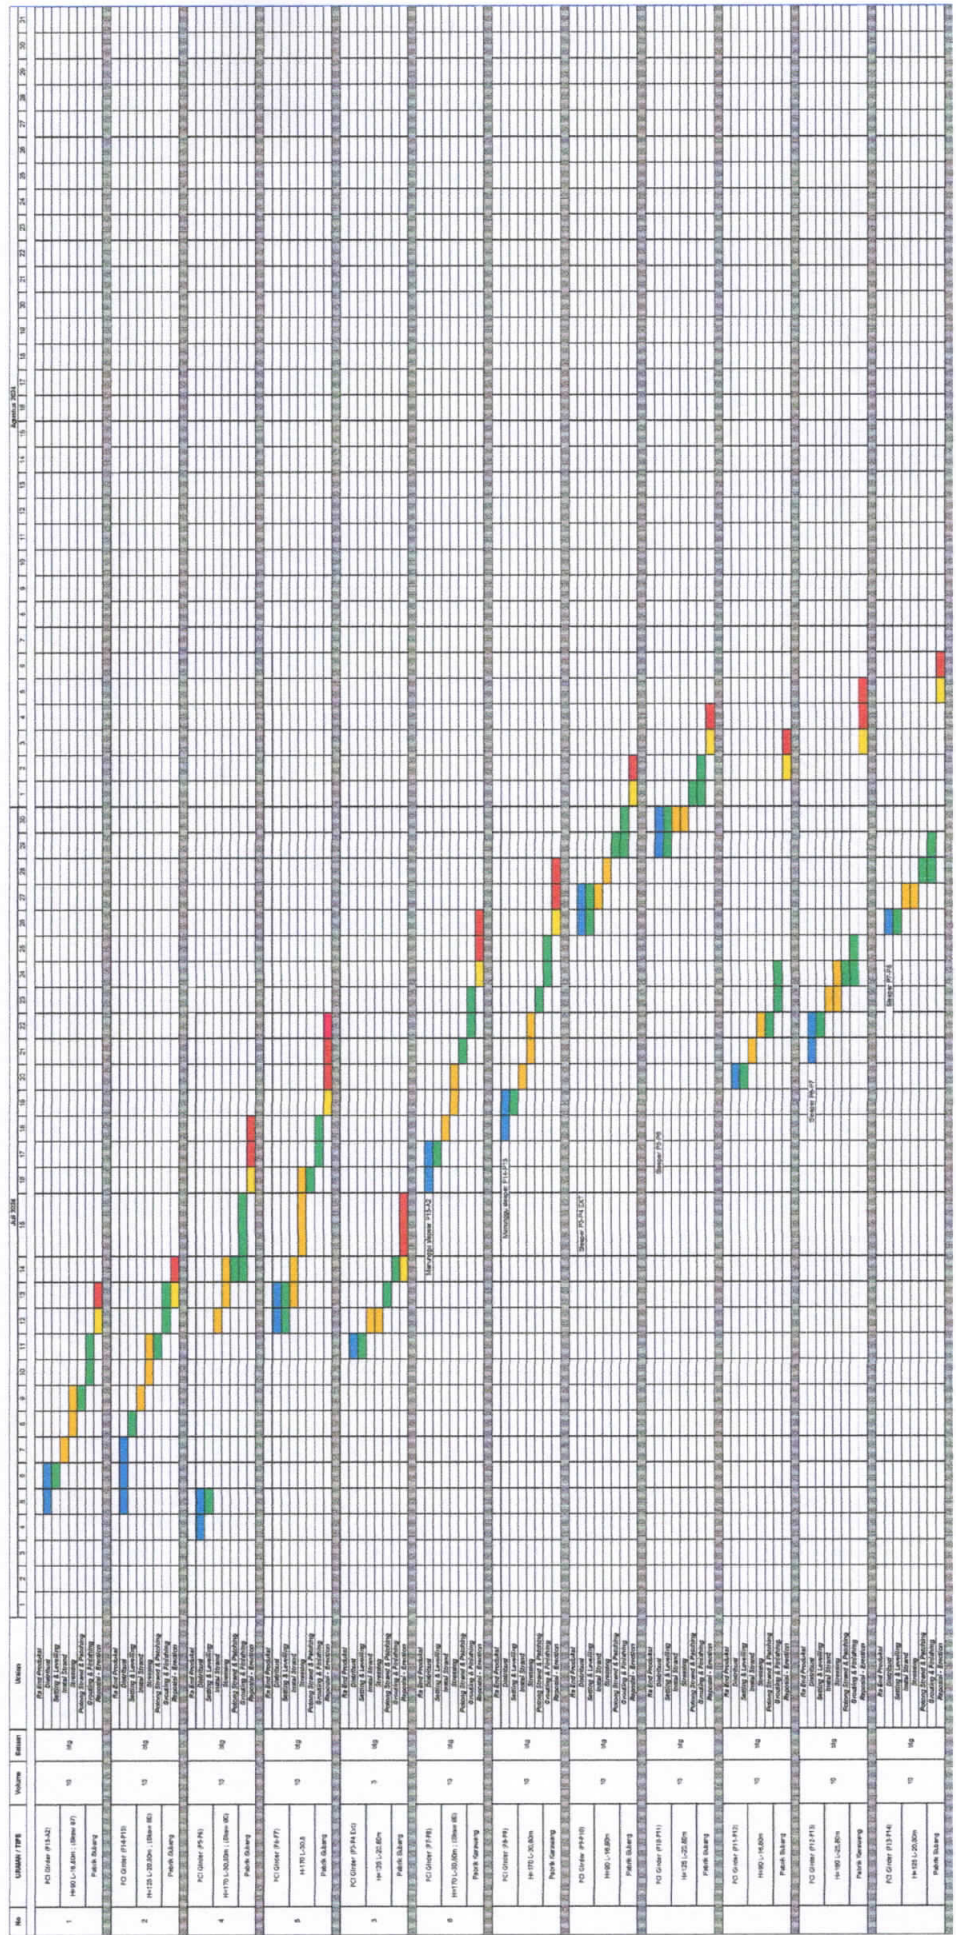

B. Pelaksanaan Pengadaan PCI Girder

No.	Foto	Uraian
1		Pabrikasi
2		Pengiriman
3		Penerimaan dan tempat penyimpanan girder di proyek
4		Install Strand

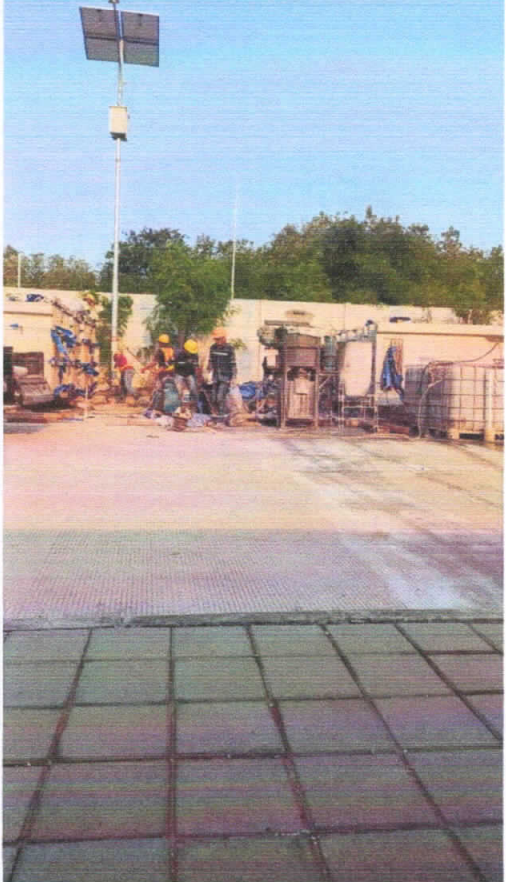5	 A photograph showing three workers in orange safety vests and hard hats working on a large, curved metal structure, likely a girder, under a blue tarp. One worker is kneeling and operating a tool, while two others stand nearby.	Stressing PC-I Girder
6	 A photograph showing several workers in safety gear working on a large, rectangular concrete structure, likely a girder, in an outdoor setting. They are using equipment to grout the structure.	Grouting PC-I Girder
7	 A photograph showing a large, rectangular concrete structure, likely an end block, being grouted. The structure is covered with a grid of metal reinforcement bars. Workers are visible in the background, and a tall pole with a solar panel is in the foreground.	Pengecoran End Block


8		Erection PC-I Girder
9		Erection PC-I Girder
10		Erection PC-I Girder

C. Foto-foto keseluruhan Kegiatan

No.	Dokumentasi	No.	Dokumentasi
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	


LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh,
PT Brantas Abipraya (Persero)
Proyek Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Dan Jalan Elevated Kawasan
Karawang



M. Chandra Yuwana
Project Manager

Dibuat oleh,
PT Brantas Abipraya (Persero)
Proyek Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Dan Jalan Elevated Kawasan
Karawang



Dorian Pariz Karimian
Site Engineering Manager
