

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PAKET PENGADAAN PCI GIRDER
PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN DAN JALAN ELEVATED KAWASAN
KARAWANG

Periode 16 Februari 2024 s.d. 17 Juni 2024



Terhitung selama 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) hari kalender

PT WIJAYA KARYA BETON TBK.

SURAT PERJANJIAN

Nomor : SWA/ERP/00017/PMRT/-P/11048/RUP/SP-008-II-2024,
Tanggal : 16 Februari 2024

Daftar Isi


Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	1
A. Jadwal Pekerjaan	2
B. Pelaksanaan Pengadaan PCI Girder	3
C. Foto-foto keseluruhan Kegiatan	6
Lembar Pengesahan	7

	LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PAKET PENGADAAN PCI GIRDER PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN ELEVATED KAWASAN KARAWANG	
--	---	--

Topik	A. Jadwal Pekerjaan B. Pelaksanaan Pengadaan PCI Girder C. Foto-foto keseluruhan Kegiatan
Nama Paket	Paket Pengadaan PCI Girder

A. Jadwal Pekerjaan

Nama Paket	:	Paket Pengadaan PCI Girder
Nama Proyek	:	Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dan Jalan Elevated Kawasan Karawang
Lokasi	:	Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang
Waktu	:	123 (Seratus Dua Puluh Tiga) hari kalender

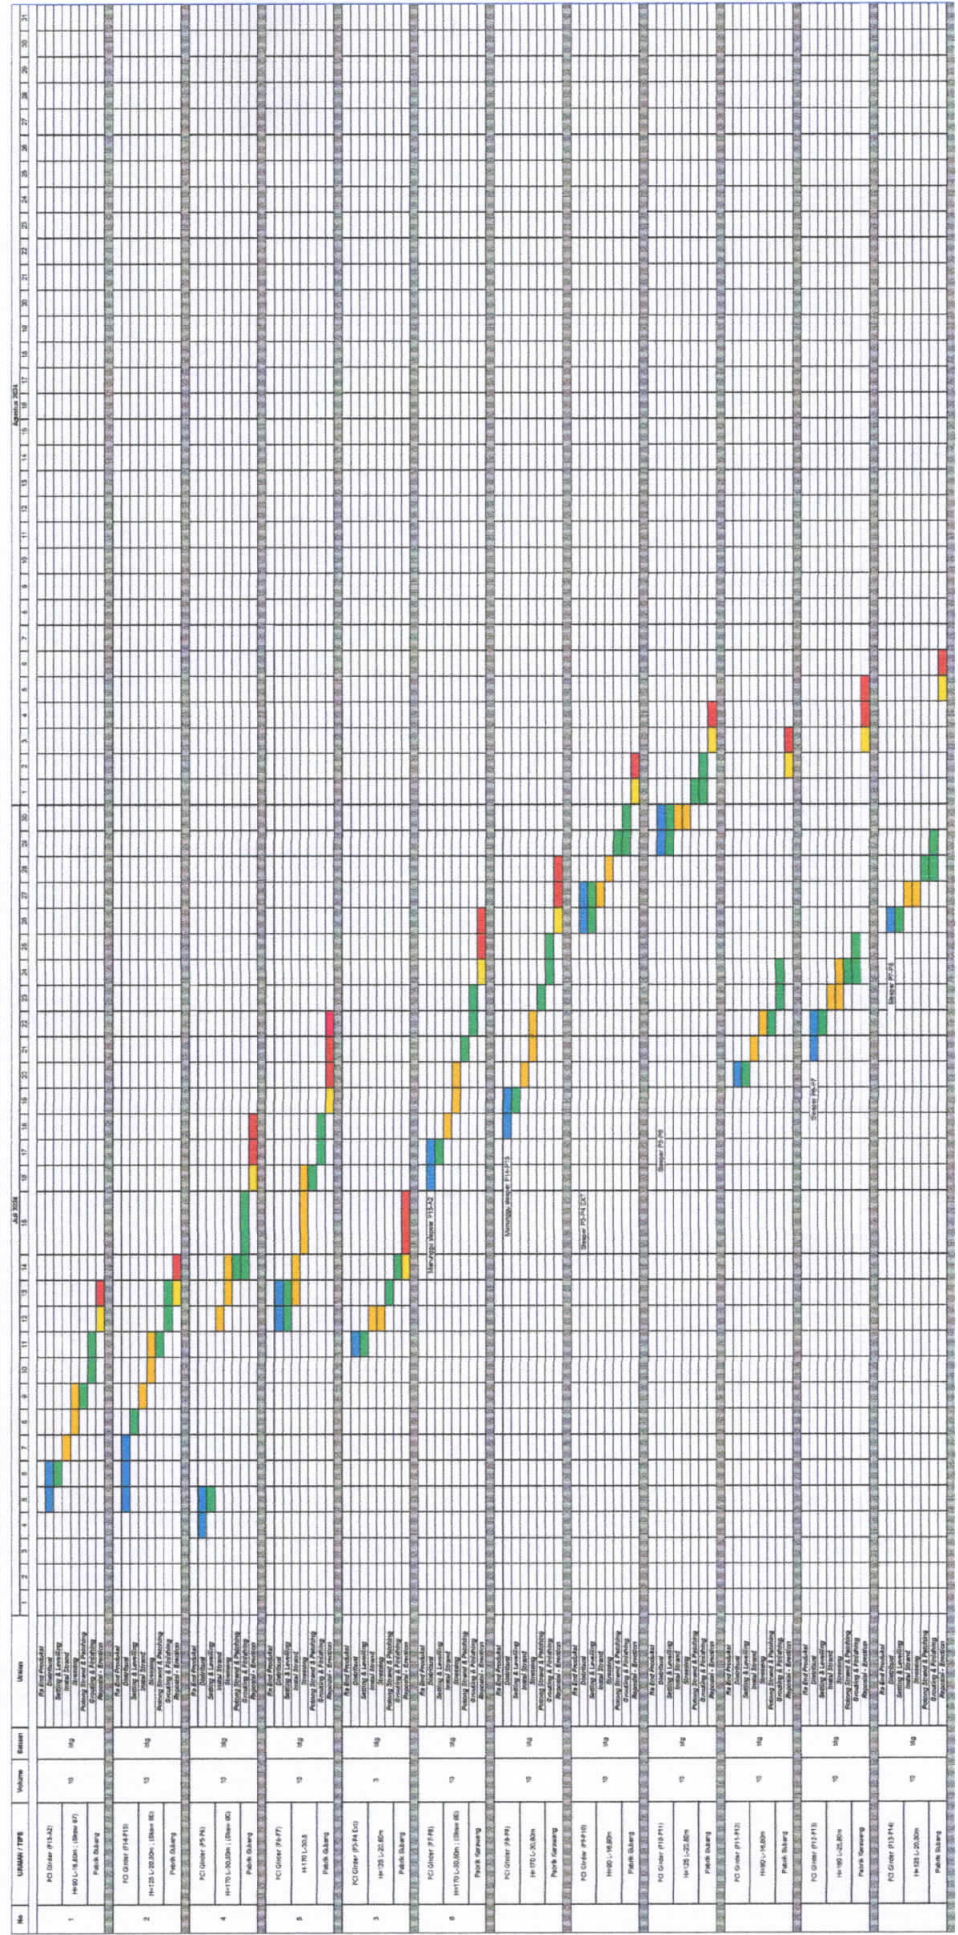

B. Pelaksanaan Pengadaan PCI Girder

No.	Foto	Uraian
1		Pabrikasi
2		Pengiriman
3		Penerimaan dan tempat penyimpanan girder di proyek
4		Install Strand

5	 A photograph showing three workers in orange safety vests and hard hats operating a large hydraulic jack to stress a precast concrete girder. The girder is supported by a metal frame, and the workers are positioned around the jack.	Stressing PC-I Girder
6	 A photograph showing several workers in safety gear performing grouting on a precast concrete girder. The girder is supported by a metal frame, and the workers are using a pump to inject grout into the structure.	Grouting PC-I Girder
7	 A photograph showing a large, rectangular concrete end block being prepared for grouting. The block is supported by a metal frame, and workers are visible in the background. The foreground shows a grid of reinforcement bars (rebar) laid out on a flat surface.	Pengecoran End Block


8		Erection PC-I Girder
9		Erection PC-I Girder
10		Erection PC-I Girder

C. Foto-foto keseluruhan Kegiatan

No.	Dokumentasi	No.	Dokumentasi
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh,
PT Brantas Abipraya (Persero)
Proyek Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Dan Jalan Elevated Kawasan
Karawang



M. Chandra Yuwana
Project Manager

Dibuat oleh,
PT Brantas Abipraya (Persero)
Proyek Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Dan Jalan Elevated Kawasan
Karawang



Bondan Fariz Rahman
Site Engineering Manager
