PT. BRANTAS ABIPRAYA – PT. GUNTUR SATRIA PERKASA
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. (021) 8516290 Fax. (021) 8516095

BERITA ACARA
PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)
Nomor : KSO/ERP/00020/PMRT/-P/10856/RUP/ANN-001-I-2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 09:00 , Bertempat di Kantor Pusat PT Brantas Abipraya. Jl. DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur 13340, Dilakukan dengan metode Virtual Conference, Telah diadakan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk paket pengadaan sebagai berikut :

Nama Paket : **Pengadaan Tiang Pancang**
Unit / Proyek : **Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1**

Panitia Pemilihan telah menjelaskan sesuai Dokumen Pemilihan, termasuk didalamnya antara lain Spesifikasi Teknis, KAK, Lingkup Pekerjaan, Ketentuan Pemilihan, dll.

Berita Acara Pemberian Penjelasan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 January 2024

Dian Setyo Nugroho
Pimpinan Rapat

NOTULEN TANYA JAWAB

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Wika Beton : Terkait spesifikasi teknis Pipa CT nya tidak ada yg 12 mm melainkan 10 - 11 mm apakah bisa	Abipraya : Terkait ct join masih mengacu dari spektek kontrak akan disdikusikan dengan direksi dan konsultan
2	Wika Beton : ini di jadwalkan produksinya akhir 4 februari, untuk material nya apakah dilakukan bending test sampai patah ?	Abipraya : iya, sampai beban ultimate atau sampai patah, item pengujian nya di blend harga satuan
3	Wika Beton : terkait pengiriman ada 2 opsi menggunakan jalur darat atau laut FOT dari pelabuhan terdekat?	Abipraya : terkait pengiriman kami masih ada pembahasan dari dinas prefer dari laut jadinya di jadikan opsi
4	Rekanan Indo Guna : menanyakan ada 2 opsi seandainya pengiriman kalau laut sudah free tongkang pak sampai ke pelabuhan dari abipraya bagaimana pak?	Abipraya : kalo plan nya masih memungkinkan dari laut langsung lewat laut jadi tidak usah bolak balik ke kcn langsung saja ke asahimas nya ke stock pile nya,berarti kalau jalur darat dan kita disetujuinya jalur laut harus ke pelabuhan nya dulu
5	Rekanan Indo Guna : terkait dengan tadi penjelasan penerimaan barang di lapangan kita cek bersama kontraktor, konsultan, owner, dan suplier itu ada list qc nya apa yg perlu diperiksa hammer test nya kah atau ada yang perlu disiapkan mungkin bisa dijelaskan pak?	Abipraya : pertama untuk penerimaan material itu surat jalan, termasuk pengecekan fisik nya terhadap kelurusan sama diameter dalam nya pak terutama yang di dalam nya pak supaya clear tidak ada semen yang menggumpal
6	Rekanan Indo guna : terkait panjang spun pile di 23 dan 24 khusus via darat sudah dipastikan bisa dilewati pak	Abipraya : untuk akses masih tahap persiapan terhadap stakeholder untuk pengiriman via darat, jika stake holder tidak ada kesepakatan untuk via darat berarti perubahan pengiriman via laut jadi harga ini diasumsikan ke marunda atau ke angol

NO	NOTED
1	Pembayaran pertama uang muka 15 % dengan jaminan Bank Garansi Mandiri atau BNI
2	Pembayaran dilakukan dengan menggunakan fasilitas scf ussance selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
3	Pencairan pembayaran 30 s/d 90 hari kalender kerja setelah dokumen diterima dengan baik dan benar
4	setiap pembayaran dipotong uang muka sebesar 15 % dan biaya diskonto menjadi beban rekanan
5	Terdapat rekanan Previlage yaitu PT Wijaya Karya Beton Tbk karena telah mendukung dalam kemenangan Tender Proyek Pembangunan Pengaman Pantai NCICD Fase A Lokasi 1 Paket 1
6	Untuk Tender menggunakan tender cepat dan dipastikan bahwa harga yang di submit merupakan harga yang terbaik karena yang diambil harga terendah

PESERTA TENDER YANG JOIN MEETING

No.	Perwakilan Dari	Nama
1	PT Wijaya Karya Beton Tbk	Okky A
		Verian
2	PT Waskita Beton Precast Tbk	Erwin
		Miftah Khoirudin
3	PT Berkarya Indo Guna	Hamzah
		Asep Isa Sobarna

ABIPRAYA - GUNTUR KSO

Dian Setyo Nugroho
Pimpinan Rapat
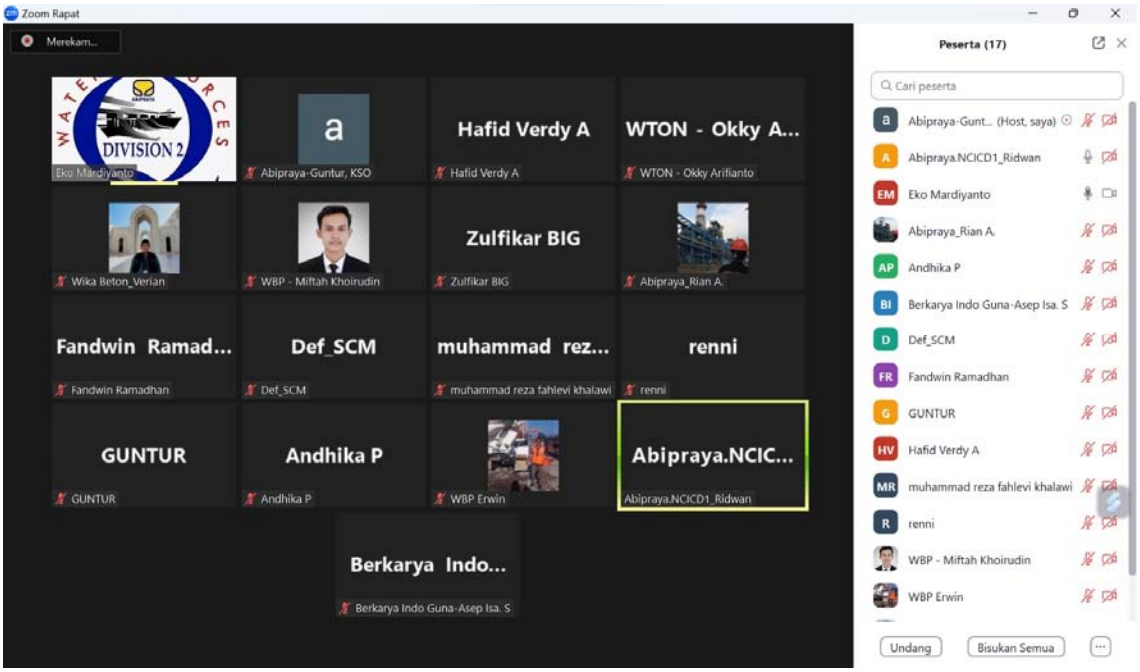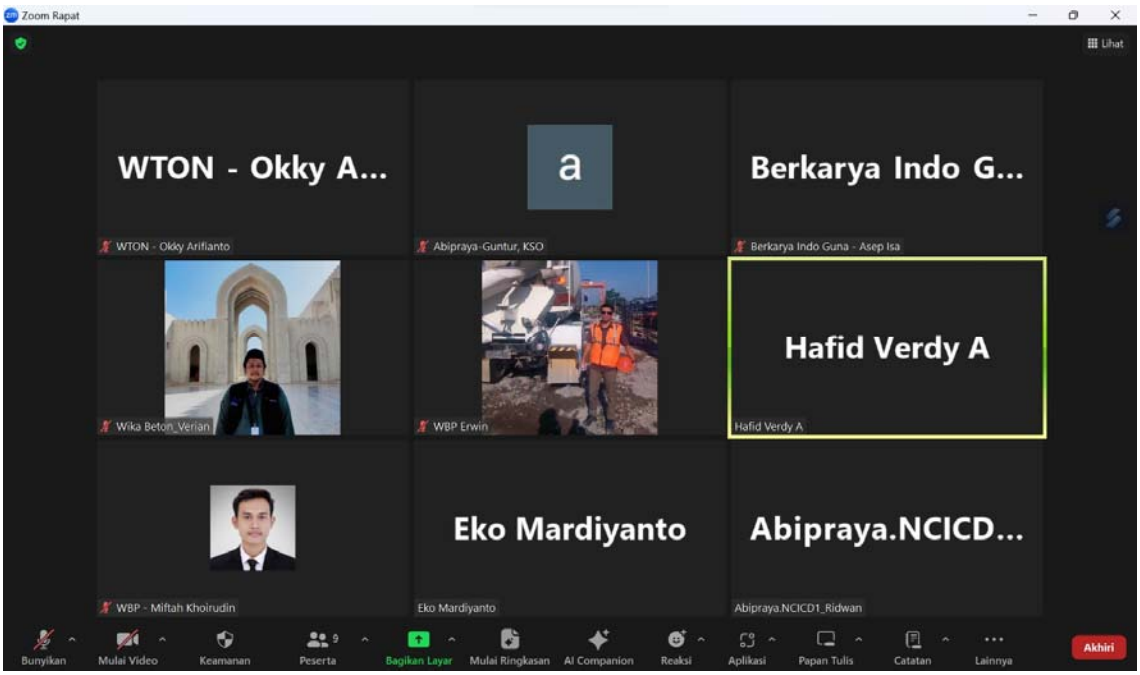
Lampiran Dokumentasi Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
